Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec
1		**MODIFICACION PRC PUCON (7 oct 2019)**	**1167,5 días**	**vie 01-03-19**	**mié 11-05-22**	
2		PREPARACION DEL PLAN	94 días?	mar 18-06-19	vie 20-09-19	
3		**Convenio y plan de trabajo**	**299 días**	**vie 01-03-19**	**mar 24-12-19**	
4		Definición Alcance Estudio (MUN-MINVU)	42 días	vie 01-03-19	jue 11-04-19	
5		Compromiso Aporte Municipal	7 días	vie 12-04-19	jue 18-04-19	4
6		Gestión presupuesto Programa IPT MINVU	14 días	vie 19-04-19	jue 02-05-19	5
7			28 días	vie 03-05-19	jue 30-05-19	6
8		Convenio Técnico y Financiero MINVU - MUNICIPIO	14 días	vie 03-05-19	jue 16-05-19	6
9		Gestiones previas de licitación (U. Administración SEREMI)	58 días	vie 17-05-19	sáb 13-07-19	8
10		**Licitación y Contrato**	**79 días**	**lun 07-10-19**	**mar 24-12-19**	
11		Licitación (Publicación)	29 días	lun 07-10-19	lun 04-11-19	
12		Preguntas	10 días	lun 07-10-19	mié 16-10-19	
13		Respuestas	2 días	mié 16-10-19	vie 18-10-19	12
14		Apertura	1 día	mar 05-11-19	mar 05-11-19	11
15		Evaluacion Ofertas	10 días	mar 05-11-19	jue 14-11-19	
16		Resolución Adjudicacion	7 días	vie 15-11-19	jue 21-11-19	15
17		Contrato	30 días	vie 22-11-19	sáb 21-12-19	16
18		Resolución Contrato	3 días	dom 22-12-19	mar 24-12-19	17
19		**DESARROLLO DEL ESTUDIO**	**958 días**	**jue 26-09-19**	**mié 11-05-22**	
20		**Etapa 1: Ajuste Metodológico**	**605 días**	**mié 25-12-19**	**vie 20-08-21**	
21		Etapa 1.A: Ejecución Etapa	5 días	mié 25-12-19	dom 29-12-19	18
22		Revisión 1 CT	3 días	lun 30-12-19	mié 01-01-20	21
23		Corrección 1 Consultor	3 días	jue 02-01-20	sáb 04-01-20	22
24		Revisión 2 CT	3 días	dom 05-01-20	mar 07-01-20	23
25		**Etapa 2: Ajuste Diagnóstico comunal**	**91 días**	**mié 08-01-20**	**mar 07-04-20**	
26		Ejecución Etapa 2	56 días	mié 08-01-20	mar 03-03-20	24
27		Revisión 1 CT	7 días	mié 04-03-20	mar 10-03-20	26
28		Corrección 1 Consultor	21 días	mié 11-03-20	mar 31-03-20	27
29		Revisión 2 CT	7 días	mié 01-04-20	mar 07-04-20	28
30		**Etapa 3: Adecuación Anteproyecto / Informe Ambiental / Consulta Procedencia CI OIT 169**	**147 días**	**mié 08-04-20**	**mar 01-09-20**	
31		Ejecución Etapa 3	98 días	mié 08-04-20	mar 14-07-20	29
32		Revisión 1 CT	14 días	mié 15-07-20	mar 28-07-20	31
33		Corrección 1 Consultor	21 días	mié 29-07-20	mar 18-08-20	32
34		Revisión 2 CT	14 días	mié 19-08-20	mar 01-09-20	33
35		**Etapa 4: Proyecto**	**353 días**	**mié 02-09-20**	**vie 20-08-21**	
36		Ejecución Etapa 4	196 días	mié 02-09-20	mar 16-03-21	34
37		Revisión 1 CT	14 días	mié 17-03-21	mar 30-03-21	36
38		Corrección 1 Consultor	21 días	mié 31-03-21	mar 20-04-21	37
39		Revisión 2 CT	14 días	mié 21-04-21	mar 04-05-21	38
40		**Etapa 5: Aprobación Plan Regulador Comunal**	**108 días**	**mié 05-05-21**	**vie 20-08-21**	
41		Ejecución Etapa 5	80 días	mié 05-05-21	vie 23-07-21	39
42		Revisión 1 CT	7 días	sáb 24-07-21	vie 30-07-21	41
43		Corrección 1 Consultor	14 días	sáb 31-07-21	vie 13-08-21	42
44		Revisión 2 CT	7 días	sáb 14-08-21	vie 20-08-21	43

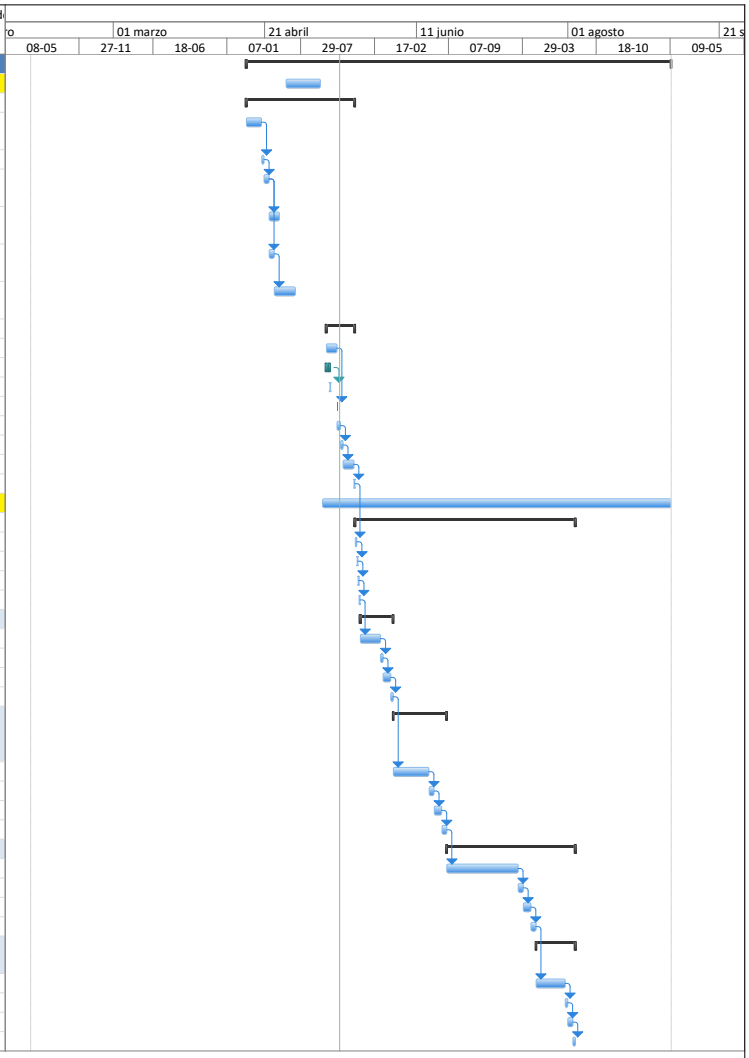

Proyecto: CRONOGRAMA MODIF.
Fecha: mié 13-11-19

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			
